



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk41

- A-lohkon vesikaton kattoelementtien asennus
- C1-lohkon maanvaraisen lattian valuvalmistelut
- Juvantien puoleisen tuulikaapin tekoa
- B-lohkon höyrynsulun asennusta
- Maalämpökaivon kooreikä poraus
- C1.lohkon lattialämmitysputkien asennus
- IVKH teräsrungon asennus alkoi
- A-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus käynnissä
- B-lohkon väestönsuojan viemärien asennus
- Kaukolämpörungon rakentaminen jatkuu
- Kaivutyöt kirjaston edessä jatkuvat

• Tulevan viikon työvaiheita

- C1-lohkon maanvaraisenlattian valu
- Kaivutyöt kirjaston edessä jatkuu
- B-lohkon vesikattotyöt alkaa
- IVKH teräsrunko asennukset jatkuu ja Pvp-elementtien asennukset alkaa

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 147

• Muita huomioitavia asioita

- Kirjaston edessä kaivutyöt etenee noin 6 m kerralla ja uraa täytetään kokoajan perässä. Kirjaston parkkipaikka joudutaan sulkemaan noin 7.10-14.10.2019 väliseksi ajaksi. Kirjaston asiakkaat voi pysäköidä torille siksi aikaa kun kirjaston parkkipaikka on suljettu. Kulku kirjastoon säilyy koko kaivutyön ajan. Tästä vielä erillinen suunnitelma kuvissa.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon
lattialämmitysputket
on asennettu ja valu
alkaa ensi tiistaina.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta




A-lohkon vesikattoelementit asennettu.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta

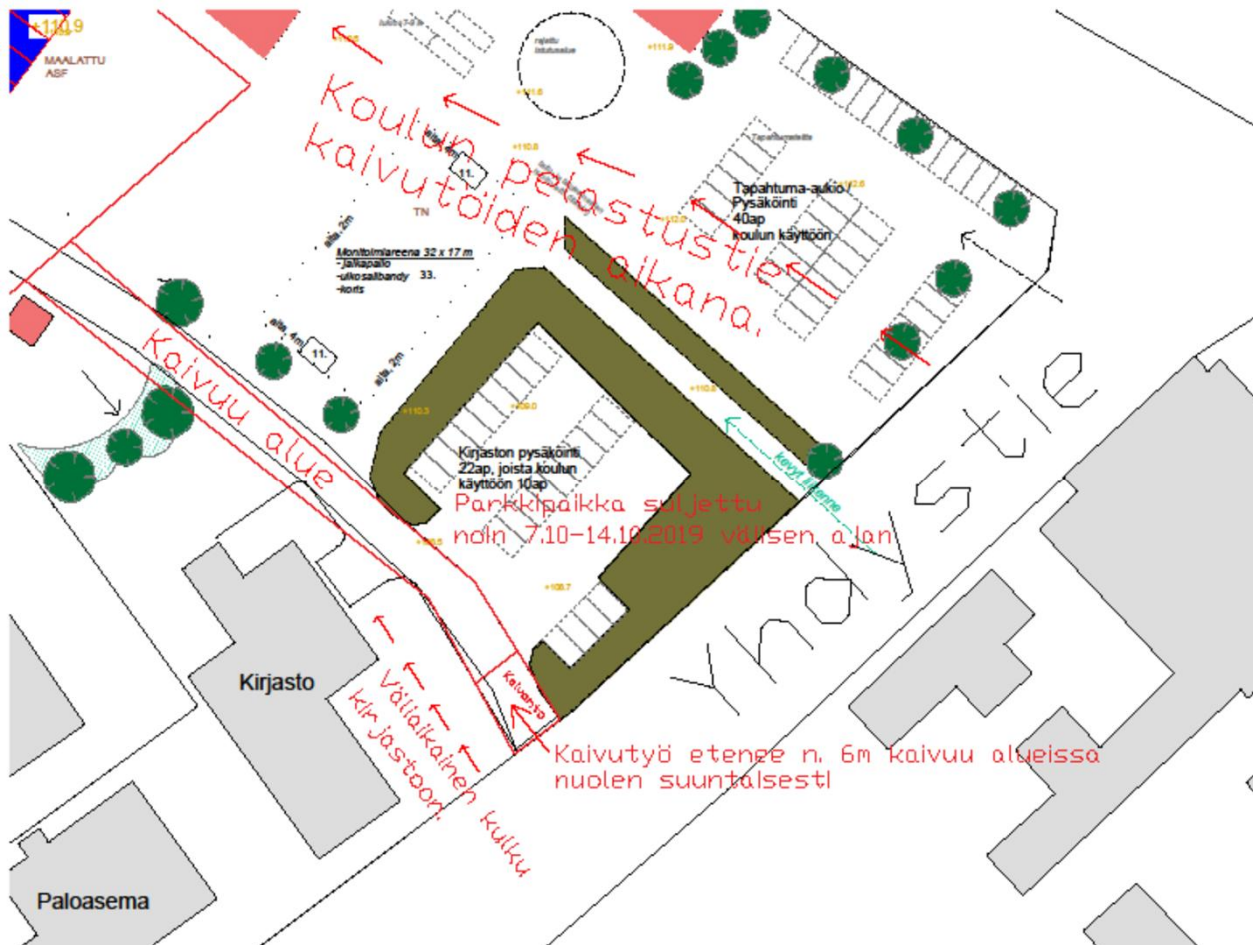

Kirjaston edustan kaivutöiden suunnitelma.

