



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk39

- A-lohkon kattotuolien asennus aloitettu
- Elementti asennukset pääosin valmiit
- C1-lohkon vesikaton kattoelementtien asennus
- B-lohkon 2 krs holvivalu
- A-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus käynnissä
- Kaukolämpörungon rakentaminen
- Kaivutyöt Sampolan edessä

• Tulevan viikon työvaiheita

- A-lohkon kattotuolien asennus jatkuu
- C2-lohkon 3krs holvivalu (IVKH)
- Kaivutyöt Sampolan edessä jatkuu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 137

• Muita huomioitavia asioita

- 7.10 aloitetaan kaivutyöt kirjaston edessä, jossa tehdään liitos kunnan hulevesiviemäriin. Kaivutyöt etenee noin 6 m kerralla ja uraa täytetään kokoajan perässä. Kirjaston parkkipaikka joudutaan sulkemaan noin 7.10-14.10.2019 väliseksi ajaksi. Kulku kirjastoon säilyy koko kaivutyön ajan. Tästä vielä erillinen suunnitelma kuvissa.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon kattoelementit asennettu ja pohjahuopasaumat hitsattu.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta




A-lohkon kattotuoli asennukset käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta

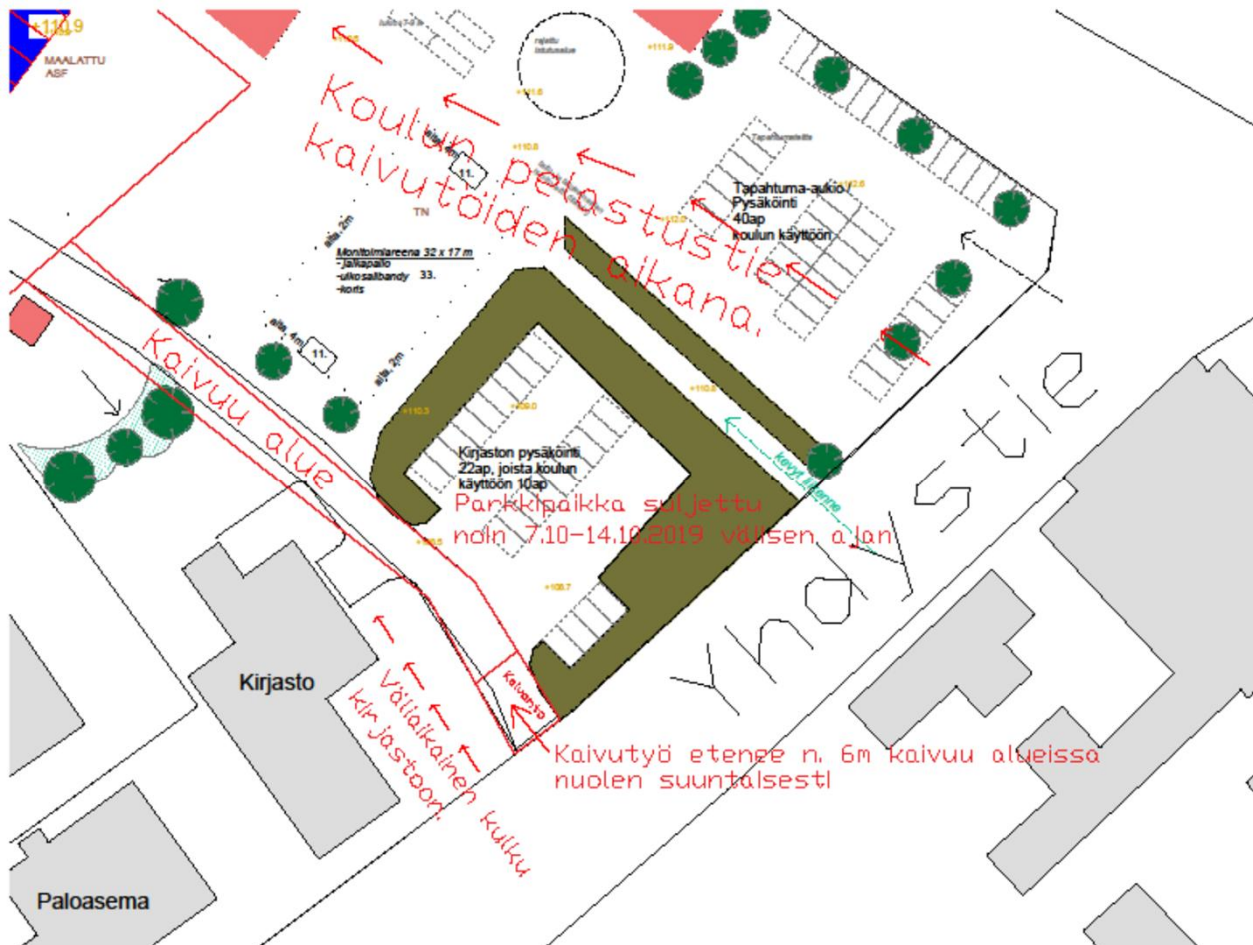

Kirjaston edustan kaivutöiden alustava suunnitelma.

